

## INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTADISTICA E INFRAESTRUCTURA TRIMESTRE 4 2018.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE ENERO 201

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
	<b>CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO LABORATORIOS Y TALLERES LT-3</b>	
OCTUBRE	<p>SE EJECUTERON LAS SIGUIENTES ACCIONES: AFINE DE LOSA DE AZOTEA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE. EJES A'-C' /9-12.</p> <p style="text-align: center;"><b>LABORATORIO DE METROLOGIA</b></p> <p>CONSTRUCCION DE CUBICULO ESPECIAL PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION POR COORDENADAS. DEMOLICION DE LOSA DE CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CIMENTACION ESPECIAL DEL EQUIPO DE MEDICION POR COORDENADAS. CONSTRUCCION DE APLANADO FINO Y PULIDO A BASE CALHIDRA Y ADITIVO EN MUROS INTERIORES DEL CUBICULO PARA EL EQUIPO DE MEDICION POR COORDENADAS. CONSTRUCCION DE ARMADURA A BASE DE PTR 2" PARA RECIBIR FALSO PLAFOND E INSTALACIONES NECESARIAS EN EL CUBICULO DE MEDICION POR COORDENADAS. RANURADO EN PISO DE CONCRETO PARA LA COLOCACION DE DUCTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES. TENDIDO DE FIRME DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 PARA RENOVACION DE PISO TERMINADO DE ACUERDO A NIVELES DE PROYECTO. INICIO DE COLOCACION DE LOSETA Y ZOCLO DE CERAMICA ESMALTADA TRÁFICO INTENSO EN PISO DEL LABORATORIO DE METROLOGIA. SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO LED DE 1.22X30 DE 45 W. EN CUBICULO DEL EQUIPO DE MEDICION POR COORDENADAS.</p>	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIOS LT-3.</b>	
OCTUBRE	<p>A LA FECHA, LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE ESTE EDIFICIO SE ENCUENTRA AL 100%. POR CONSIGUIENTE, PASA A LA ETAPA DE CONVOCATORIA PARA LA LICITACION DE OBRA PUBLICA.</p> <p>EL DIA MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE PUBLICA EN LOS MEDIOS LOCALES LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL 003. CON NO. DE LICITACION SUP-POT-LP-03-2018.</p> <p>EL DIA LUNES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS 10:00 HRS. EL ITIFE CONJUNTAMENTE CON LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, REALIZARA LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.</p> <p>EL MISMO DIA DE LA VISITA, A LAS 15:30 HRS. SE LLEVARA A CABO EN LAS OFICINAS DEL ITIFE LA JUNTA DE ACLARACIONES.</p>	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIO UD-5 (ETAPA 2)</b>	
OCTUBRE	<p>EL PROYECTO EJECUTIVO DE ESTE EDIFICIO SE ENCUENTRA AL 100 %. SE ENVÍO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INIFED PARA SU APROVACION Y AUTORIZACION. UNA VEZ QUE EL ITIFE RECIBA EL OFICIO DE ASIGNACION PROCEDERA AL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE.</p>	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
NOVIEMBRE	<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL</b>	

NOVIEMBRE	<p><b>SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</b> CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO PARA CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA DE LLUVIA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE ESTUDIANTES, A SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA SECCION PRIMERA, AYUNTAMIENTO DE ZACATELCO.</p> <p style="text-align: center;"><b>LABORATORIO DE METROLOGIA</b></p> <p>TERMINACION DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL CUBICULO ESPECIAL PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION POR COORDENADAS Y DEL LABORATORIO DE METROLOGIA. (CABE MENCIONAR QUE EL LABORATORIO CONTINUA FUERA DE SERVICIO YA QUE EN ESTA ETAPA NO SE CONTEMPLARON LAS REDES EXTERIORES DE ALIMENTACION ELECTRICA Y ALIMENTACION DE VOZ Y DATOS)</p>	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
NOVIEMBRE	<p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIOS LT-3.</b></p> <p>A LA FECHA, LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE ESTE EDIFICIO SE ENCUENTRA AL 100%. EL DIA MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE PUBLICA EN LOS MEDIOS LOCALES LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL 003, <b>CON NO. DE LICITACION SUP-POT-LP-03-2018.</b> EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SE CELEBRO EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO EN LAS OFICINAS DEL ITIFE EN DONDE SE DECLARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A LA <b>CONTRATISTA "GRUPO URBANIZADOR ZADE S.A DE C.V"</b>. EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y DEBERAN SER CONCLUIDOS EL 27 DE ENERO DEL 2019.</p>	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
NOVIEMBRE	<p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIO UD-2 (ETAPA-2)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIO UD-5 (Etapa 2).</b></p> <p>EL PROYECTO EJECUTIVO DE ESTE EDIFICIO SE ENCUENTRA AL 100 %. SE ENVÍO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INIFED PARA SU APROVACION Y AUTORIZACION. UNA VEZ QUE EL ITIFE RECIBA EL OFICIO DE VALIDACION SE PROCEDERA AL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE.</p>	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
DICIEMBRE	<p style="text-align: center;"><b>ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA</b></p> <p><b>SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</b> DESMONTAJE SIN RECUPERACION DEL PISO DE CERAMICA EXISTENTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA 60X60 EN AREA DE COMENSALES; CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6X6 Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA DE 30X30 EN TERRAZA EXTERIOR AL AREA DE COMENSALES.</p>	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
DICIEMBRE	<p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIOS LT-3.</b></p> <p>A LA FECHA, LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE ESTE EDIFICIO SE ENCUENTRA AL 100%. EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SE CELEBRO EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO EN LAS OFICINAS DEL ITIFE EN DONDE SE DECLARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A LA <b>CONTRATISTA "GRUPO URBANIZADOR ZADE S.A DE C.V"</b>. EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y DEBERAN SER CONCLUIDOS EL 27 DE ENERO DEL 2019. <b>POR RAZONES DESCONOCIDAS EL CONTRATISTA NO HA INICIADO LA ETAPA CONSTRUCTIVA.</b></p>	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
DICIEMBRE	<p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIO UD-5 (ETAPA 2)</b></p> <p>EL PROYECTO EJECUTIVO DE ESTE EDIFICIO SE ENCUENTRA AL 100 %. SE ENVÍO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INIFED PARA SU APROVACION Y AUTORIZACION. UNA VEZ QUE EL ITIFE RECIBA EL OFICIO DE VALIDACION SE PROCEDERA AL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE.</p>	

## CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO LABORATORIOS Y TALLERES LT-3



APLANADO Y COLOCACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA EJES A' -C' / 9-18 EDIF. LT-3 CUERPO "B"



**DEMOLICION DE LOSA PARA CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y CUBICULO ESPECIAL PARA INSTALAR EQUIPO DE MEDICION POR COORDENADAS LABORATORIO DE METROLOGIA EDIF.LT-3 CUERPO "B"**



**CONSTRUCCION DE ARMADURA PARA COLOCACION DE PLAFON A BASE DE PERFILES PTR DE 2" PARA RECIBIR PLAFOND E INSTALACIONES ELECTRICAS EN CUBICULO DEL EQUIPO DE MEDICION POR COORDENADAS LABORATORIO METROLOGIA EDIF.LT-3 CUERPO "B"**







**OBRA EXTERIOR: CIMBRADO Y COLADO CON CONCRETO F' C=200KG/CM2 EN PAREDES Y FIRME DE LA ALCANTERILLA PLUVIAL**



**OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y TAPA PARA CONEXION A LA ALCANTARILLA PLUVIAL**

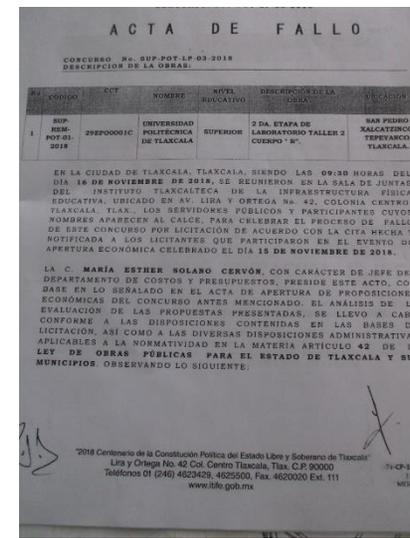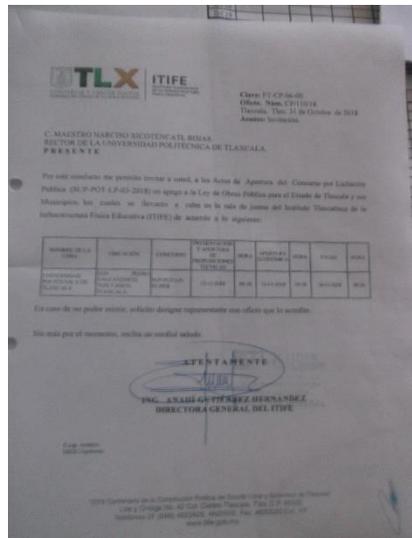

**OFICIO DE INVITACION A LOS ACTOS DE APERTURA DEL CONCURSO POR LICITACION PÚBLICA SUP-POT-LP-03-2018 Y ACTA DE FALLO DONDE SE ADJUDICA LA CONSTRUCCION DE LA "2DA ETAPA DE LABORATORIO TALLER II CUERPO B"**



**CAFETERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA 60X60 EN AREA DE COMENSALES Y CONSTRUCCION DE TERRAZA.**



**OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO DE EQUIPO PARA CALENTADORES SOLARES DE 30 TUBOS C/UNO, PARA INSTALARSE EN EL GIMNASIO UNIVERSITARIO.**
