



CITLALI ANGELES LOPEZ
AELC870504AR4
cluster44@hotmail.com

org

ESTIMACIÓN 2(DOS)FINIQUITO

CONTRATISTA:	CITLALI ANGELES LOPEZ
OBRA:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO U.D.-I, CONSISTENTE EN CAMBIO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES, PRELIMINARES ACABADOS
UBICACIÓN:	KILOMETRO 9.5 CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA, AVENIDA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA NÚMERO 1, XALCALTZINCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.
CONTRATO:	068/07/2021
PERIODO DE CONTEXTO:	DEL 30 JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
	Nº. DE ESTIMACIÓN: 2 (DOS) FINIQUITO
	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2021

No.	CONCEPTO	UNIDAD	P.L.	CONTRATADO		ESTA ESTIMACION 2(DOS) FINIQUITO		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO		
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO U.D.-I, CONSISTENTE EN CAMBIO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES, PRELIMINARES ACABADOS												
1	RETIRO Y RECOLOCACION DE FOTOCELDAS Y CALENTADORES SOLARES UBICADOS EN AZOTEAS, INCLUYE MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA	PZA	\$ 306.6119	27.00	\$ 8,278.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	27.00	8,278.52	
2	RETIRO DE LOSETA DE 30x30 EN AZOTEA DE EDIFICIO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL DE DESECHO ACERBIOS HORIZONTAL Y VERTICAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DE LOSETA, MANO DE OBRA, APLAMANTO DE MATERIAL RECUPERADO, EQUIPO.	M2	\$ 119.93	1,735.60	\$ 208,154.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,731.51	207,663.63	
3	RETIRO DE ENTORTADO Y RELLENO PARA SU COPIO EN EL LUGAR HASTA 15 CM DE ESPESOR EXISTENTES EN AZOTEA PARA SU REUTILIZACION EN PENDIENTES, INCLUYE ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	M2	\$ 164.45	1,735.60	\$ 285,420.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO 400 MM GRANULAR ROJO A.P.P. LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO COMPLETO CON ASFALTO MODIFICADO A BASE DE ESTIRENO BLENDED REFORZADO CON ALMA CENTRAL DE POLIESTER SPONDOBOND DE 100 GRM2 CON RESINA TERMOFUSA, SU CARA SUPERIOR PRESENTA UN ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCION SIENDO A SU VEZ DECORATIVA CON TRASLAPIS DE 10 CM LONGITUDINAL Y 15 CM TRANSVERSAL COMO MINIMO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION CON GAS BUTANO, INCLUYE ELIMINACION DE POLVO, GRASA FALSAS, ADHERENCIAS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMER ASFALTICO TAPA PORO HIDROPRIMER, SELLADO EN CASQUILLOS DE BAJANTES PLUVIALES Y CHIFLANES CON CEMENTO PLASTICO, CALEFATEO Y CORTE DE GRIETAS CON DISCO HASTA 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE SELLADOR, CEMENTO FLEXIBLE (BASECOAT) Y CEMENTO PLASTICO HS GARANTIA 10 AÑOS DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO	M2	\$ 335.15	1,735.60	\$ 581,683.22	0.0000	\$ -	0.00	\$ -	1,731.51	580,312.46	
5	FIJACION DE SELLADO DE TAPAJUNTAS DE LAMINA QUE CUBRE LA SEPARACION DE EDIFICIOS EN AREA DE RECTORIA Y MODULO DE ESCALERAS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 248.25	24.00	\$ 5,958.04	18.8100	\$ 4,669.62	18.8100	\$ 4,669.62	25.5900	6,352.76	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES DE PLAFON ACUSTICO DE 1.20x0.60, SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD	M2	\$ 574.04	276.48	\$ 158,711.69	278.4645	\$ 159,850.86	278.4645	\$ 159,850.86	278.46	159,850.86	

SUBTOTAL HOJA	\$ 1,248,206.60	TOTAL	\$ 164,520.48	TOTAL	\$ 164,520.48	TOTAL	\$ 164,520.48
TOTAL	\$ 1,248,206.60	TOTAL	\$ 164,520.48	TOTAL	\$ 164,520.48	TOTAL	\$ 164,520.48
IVA	\$ 199,713.06	IVA	\$ 26,323.28	IVA	\$ 26,323.28	IVA	\$ 26,323.28
IMPORTE	1,447,919.66	IMPORTE	\$ 190,843.76	IMPORTE	\$ 190,843.76	IMPORTE	\$ 190,843.76

CITLALI ANGELES LOPEZ
ARQUITECTO CITLALI ANGELES LOPEZ

GABINO HUGO RAMOS DELGADO
ARQUITECTO GABINO HUGO RAMOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

LICENCIADO SALVADOR PADILLA SANCHEZ
ARQUITECTO GABINO HUGO RAMOS DELGADO
JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO SALVADOR PADILLA SANCHEZ
LICENCIADO SALVADOR PADILLA SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCION



CITLALI ANGELES LOPEZ
 AELC870504AR4
 cluster44@hotmail.com

No. CONTRATO:	088/07/2021
NOMBRE DE LA OBRA:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO UD-1, CONSISTENTE EN CAMBIO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES, PRELIMINARES ACABADOS
CONTRATISTA:	CITLALI ANGELES LOPEZ
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 30 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2021
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2021
NÚMERO DE ESTIMACIÓN:	2 (DOS) FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

No.	PRELIMINARES LT1	LOCALIZACIÓN			FORMULA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	CANTIDAD	
		EJE	DE	A							PARCIAL	TOTAL
5	FIJACION DE SEALLADO DE TAPAJUNTAS DE LAMINA QUE CUBRE LA SEPARACION DE EDIFICIOS EN AREA DE RECTORIA Y MODULO DE ESCALERAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	A	1	2		10.07					10.07	
		F	1	2		8.74					8.74	18.81
												18.81
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES DE PLAFON ACUSTICO DE 1.20*0.61, SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD	1	A	F	laboratorio computo 2	1.20	0.61	0.73	378.00	M2	276.70	276.70
		1	A	F	laboratorio computo 3				22.00			
		1	A	F	departamento de informatica				16.00			
		1	A	F					54.00			
		1	A	F	aula 14				9.00			
		1	A	F	aula 13				20.00			
		1	A	F	aula 12				21.00			
		1	A	F	aula 11				16.00			
		1	A	F	aula 10				15.00			
		2	A	F	aula 9				12.00			
		2	A	F	aula 8				18.00			
		2	A	F	aula 7				21.00			
		2	A	F	aula 6				25.00			
		2	A	F	aula 5				11.00			
		2	A	F	sanit. Hombres				10.00			
2	A	F	sanit. Mujeres				8.00					
2	A	F	labor. Idiomas pasillo				18.00					
							82.00					
							378.00	pieza				

ARQUITECTO CITLALI ANGELES LOPEZ
 CONTRATISTA

ARQUITECTO HILARIO REYES ROMERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA

ARQUITECTO GABINO HUGO RAMOS DELGADO
 JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE
 INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO SALVADOR RADILLA SANCHEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION



CITLALI ANGELES LOPEZ

AELC870504AR4
cluster44@hotmail.com
Tel:246 101 0190

CROQUIS DE GENERADOR ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

CONTRATISTA: CITLALI ANGELES LOPEZ


Número de contrato: 088/07/2021 Período de ejecución Convenio:

Período de Estimación: DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2021

Nombre de la obra: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO UD-1, CONSISTENTE EN CAMBIO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES, PRELIMINARES ACABADOS

Ubicación: KILOMETRO 9.5 CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA, AVENIDA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA NÚMERO 1, XALCALTZINCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.

Estimación: 2 (DOS) FINIQUITO

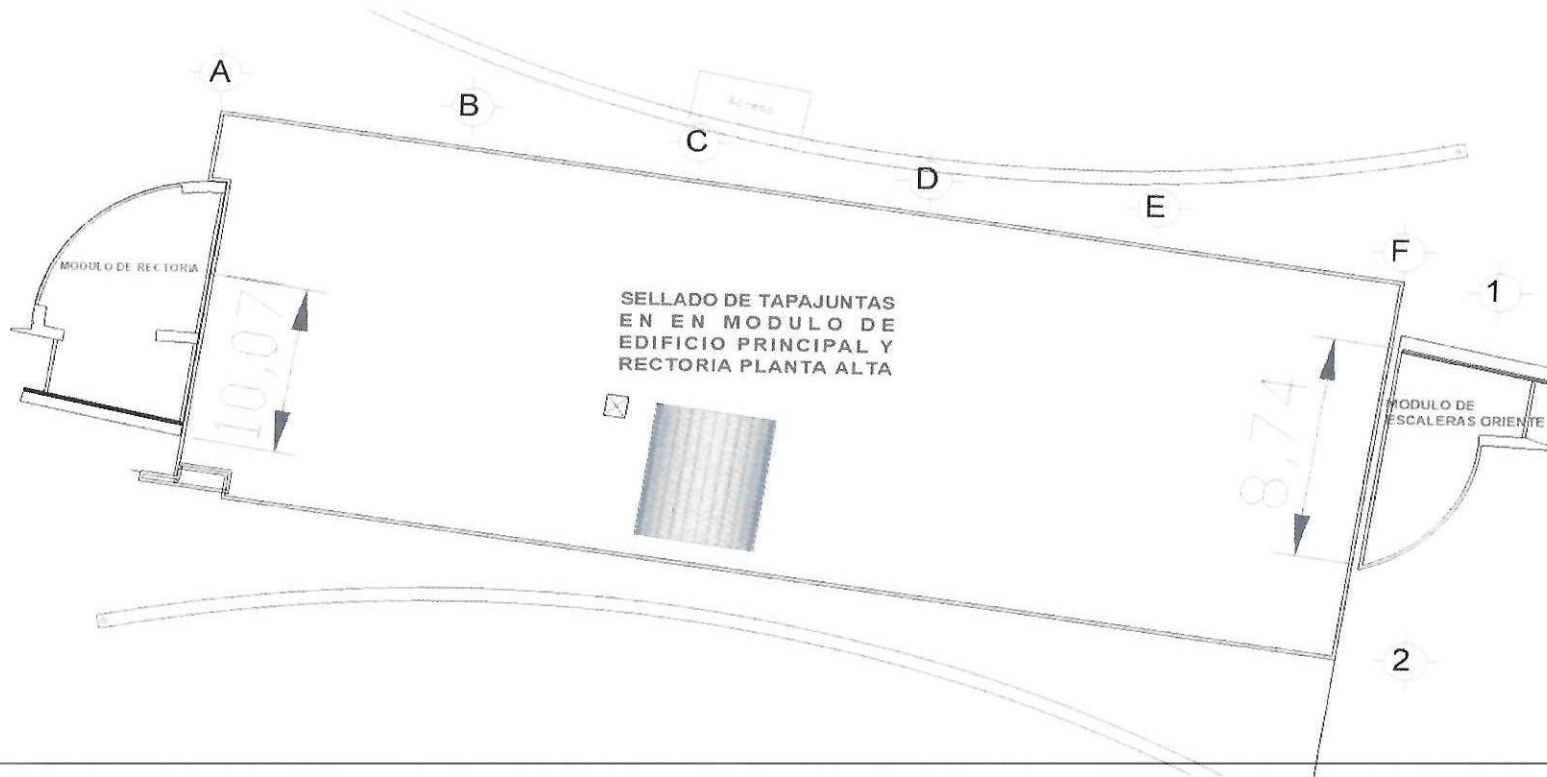

5

FIJACION DE SELLADO DE TAPAJUNTAS DE LAMINA QUE CUBRE LA SEPARACION DE EDIFICIOS EN AREA DE RECTORIA Y MODULO DE ESCALERAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ARQUITECTO CITLALI ANGELES LOPEZ
CONTRATISTA

ARQUITECTO HIBARIO REYES ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y ESTADISTICA

ARQUITECTO GABINO HUGO RAMOS DELGADO
JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO SALVADOR PADILLA SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION



CITLALI ANGELES LOPEZ

AELC870504AR4
cluster44@hotmail.com
Tel:246 101 0190

CROQUIS DE GENERADOR ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

CONTRATISTA: CITLALI ANGELES LOPEZ

Número de contrato: 088/07/2021

Periodo de ejecución Convenio:

Periodo de Estimación:

DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2021

Nombre de la obra: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO UD-1, CONSISTENTE EN CAMBIO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES, PRELIMINARES ACABADOS

Ubicación: KILOMETRO 9.5 CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA, AVENIDA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA NÚMERO 1, XALCALTZINCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.

Estimación: 2 (DOS) FINIQUITO



6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES DE PLAFON ACUSTICO DE 1.20*0.61, SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, ANRAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD

ARQUITECTO CITLALI ANGELES LOPEZ
CONTRATISTA

ARQUITECTO HILARIO REYES ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA

ARQUITECTO GABINO HUGO RAMOS DELGADO
JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO SALVADOR PADILLA SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION



CITLALI ANGELES LOPEZ
AELC870504AR4
cluster44@hotmail.com
Tel:246 101 0190

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

CONTRATISTA: CITLALI ANGELES LOPEZ

Número de contrato 088/07/2021

Periodo de ejecución Contrato: DEL 30 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2021


Periodo de Estimación:

DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2021

Nombre de la obra: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO UD-1, CONSISTENTE EN CAMBIO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES, PRELIMINARES ACABADOS

Ubicación: KILOMETRO 9.5 CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA, AVENIDA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA NÚMERO 1, XALCALTZINCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.

Estimación: 2 (DOS) FINIQUITO

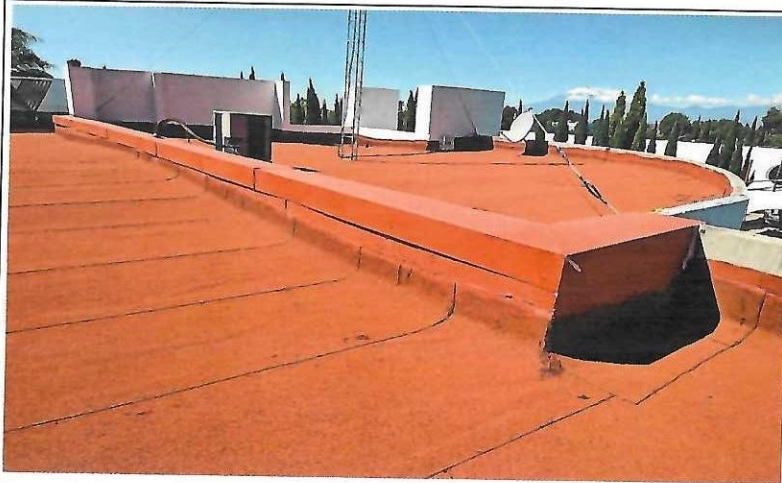

5 FIJACION DE SELLADO DE TAPAJUNTAS DE LAMINA QUE CUBRE LA SEPARACION DE EDIFICIOS EN AREA DE RECTORIA Y MODULO DE ESCALERAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ARQUITECTO CITLALI ANGELES LOPEZ
CONTRATISTA

ARQUITECTO HILARIO REYES ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA

ARQUITECTO GABINO HUGO RAMOS DELGADO
JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE

LICENCIADO SALVADOR PADILLA SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION



CITLALI ANGELES LOPEZ
AELC870504AR4
cluster44@hotmail.com
Tel:246 101 0190

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

CONTRATISTA: CITLALI ANGELES LOPEZ

Número de contrato 088/07/2021

Periodo de ejecución Contrato: DEL 30 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2021

Periodo de Estimación:

DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2021

Nombre de la obra: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO UD-1, CONSISTENTE EN CAMBIO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES, PRELIMINARES ACABADOS

Ubicación: KILOMETRO 9.5 CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA, AVENIDA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA NÚMERO 1, XALCALTZINCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.

Estimación: 2 (DOS) FINIQUITO



6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES DE PLAFON ACUSTICO DE 1.20*0.61, SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD

ARQUITECTO CITLALI ANGELES LOPEZ
CONTRATISTA

ARQUITECTO HILARIO REYES ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA

ARQUITECTO GABINO HUGO RAMOS DELGADO
JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE

LICENCIADO SALVADOR PADILLA SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION



CITLALI ANGELES LOPEZ

AELC870504AR4

cluster44@hotmail.com

Tel:246 101 0190

ESTADO DE CUENTA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA CONSISTEN EN: CAMBIO DE SISTEMA A DE IMPERMEABILIZACION, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES

CONCEPTO DE INVERSIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO UD-1, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE CONTINGENCIA

LOCALIDAD SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO. CONTRATO N° 088/07/2021

OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EDIFICIO UD-1, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, SELLADO A BAJADAS PLUVIALES, PRELIMINARES. PLAZO DE EJECUCION 26 DIAS

MUNICIPIO: TEPEYANCO, TLAXCALA PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 30 DE JULIO DEL 2021 AL 24 DE AGOSTO 2021

PERIODO DE ESTIMACIÓN 2(DOS)FINIQUITO 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 24 DE AGOSTO 2021

EMPRESA O CONTRATISTA CITLALI ANGELES LOPEZ R.F.C. AELC870504AR4

IMPORTE DE CONTRATO	IMPORTE SIN IVA	\$	1,248,206.60	ANTICIPO DE OBRA	IMPORTE SIN IVA:	\$374,461.98
	IVA	\$	199,713.06		IVA:	\$59,913.92
	MONTO TOTAL	\$	1,447,919.66		MONTO TOTAL:	\$434,375.90
	GRAN TOTAL	\$	1,447,919.66			

CONCEPTO DE INVERSIÓN	PERIÓDICO	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SIN IVA	SUB TOTAL	I.V.A. 16%	IMPORTE	5 AL MILLAR	NETO A PAGAR
ANTICIPO DE OBRA		\$374,461.98	\$0.00	\$374,461.98	\$59,913.92	\$434,375.90	\$0.00	\$434,375.90
ESTIMACION 1 (UNO)		\$797,938.27	\$239,381.48	\$558,556.79	\$89,369.09	\$647,925.88	\$3,989.69	\$643,936.19
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)		\$164,520.48	\$135,080.50	\$29,439.98	\$4,710.40	\$34,150.38	\$822.60	\$33,327.78
TOTAL		\$1,336,920.73	\$374,461.98	\$962,458.75	\$153,993.40	\$1,116,452.15	\$4,812.29	\$1,111,639.86

MONTO DEL CONTRATO \$	1,248,206.60	
ESTIMACIÓN ACUMULADA POR ESTIMAR		\$962,458.75
SUBTOTAL \$	1,248,206.60	\$285,747.85
IVA \$	199,713.06	\$1,248,206.60
\$	1,447,919.66	\$199,713.06
		\$1,447,919.66

ANTICIPO DE OBRA	\$374,461.98	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA POR AMORTIZAR		\$374,461.98
SUBTOTAL	\$374,461.98	\$374,461.98
IVA	\$59,913.92	\$59,913.92
	\$434,375.90	\$434,375.90

RENUNCIO A COBRAR: \$285,747.85


DOCEIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 85/M.N.)

ARQUITECTO CITLALI ANGELES LOPEZ
CONTRATISTA

ARQUITECTO HILARIO REYES ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y ESTADISTICA

ARQUITECTO GABINO HUGO RAMOS DELGADO
JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE

LICENCIADO SALVADOR PADILLA SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION





CITLALI ANGELES LOPEZ
PERSONA FISICA
R.F.C. AELC870504AR4

TLAXCALA, TLAX. 24 DE AGOSTO 2021

ASUNTO: aviso de terminación de obra.

MTRO. ENRIQUE PADILLA SÁNCHEZ
RECTOR.
P R E S E N T E.

Me refiero a los trabajos del contrato 088/07/2021, referente al mantenimiento correctivo a impermeabilización en losa de azotea de edificio UD-1, consistente en cambio de sistema de impermeabilización, sellado a bajadas pluviales, preliminares acabados, me permito informarle que con esta fecha 24 de agosto de 2021 se da por concluido los trabajos encomendados en el contrato arriba mencionado, por lo cual le agradezco por la invitación

Sin más por el momento, le reitero mi saludo.

Atentamente.

Arquitecta Citlali Angeles López
Persona Física.



CITLALI ANGELES LOPEZ
PERSONA FISICA
R.F.C. AELC870504AR4

TLAXCALA, TLAX. 24 DE AGOSTO 2021

ASUNTO: RENUNCIA A COBRO.

MTRO. ENRIQUE PADILLA SÁNCHEZ
RECTOR.
PRESENTE.

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo, y me permito informarle de manera puntual que **renuncio** a cobrar la cantidad de \$ 285, 747.85 (Doscientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos 85/M.N.) del concepto número 3 referente al retiro de entortado y relleno para su acopio en el lugar hasta 15 cm de espesor existentes en azotea para su reutilización en pendientes, incluye: abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta.

Sin más por el momento, le reitero mi saludo.

Atentamente.

Arquitecta Citlali Ángeles López
Persona Física.

estando revisados en el edificio UO-1 y de haber realizado un ultimo recorrido sobre los trabajos realizados; se manifiesta en esta bitacora que los trabajos son finalizados en tiempo y forma de acuerdo al calendario de ejecucion; tambien se menciona que se sellaron las juntas (tapajuntas) del edificio. tambien mencionamos que con esta fecha 24-agosto 2021 se cierra esta bitacora de obra del contrato 088102/2021 referente al mantenimiento correctivo a impermeabilizacion en asetea de edificio UO-1; consistente en cambio de impermeabiliza. la persona fisica hace entrega del inmueble a las autoridades de la institucion:

Persona fisica:

Arg. Citlali Angeles Lopez
Persona fisica

Por la institucion:

Arg. Hugo Ramos Delgado
Jefe del departamento de
infraestructura

Arg. Hilario Reyes Romero
Jefe del departamento de
infraestructura y estadística.
