INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADÍSTICA TRIMESTRE 2 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE JULIO DE 2020.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO.

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO UD-5 ETAPA 2		
ABRIL	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO INTERIORES Y EXTERIORES; CONSTRUCCION DE MESETAS DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PARA RECIBIR OVALINES; INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y SANITARIAS EN AREA DE BAÑOS DE PLANTA BAJA; COLOCACION DE CANASTILLA METALICA PARA INSTALACION DE VOZ Y DATOS A NIVEL DE LOSA DE ENTEREPISO; ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE COLUMNAS EN PLANTA DE PRIMER NIVEL; CIMBRADO EN FONDOS Y ARMADO DE TRABES PORA LOSA DE AZOTEA.	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES
MAYO	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS, CASETONES DE POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y COLOCACION DE MAYA ELECTROSOLDADA EN LOSA DE AZOTEA (NIVEL 7.8 M); SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE AZOTEA (NIVEL 7.8 M); CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN LOSA DE ENTREPISO, APLANADO DE MUROS INTERIORES EN LOSA DE ENTREPISO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSDAS Y CASETONES DE POLIESTIRENO EN LOSA DE AZOTEA (NIVEL 9.8 M)	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES
JUNIO	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONTINUA LA CONSTRUCCION DE MUROS EXTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO; CONSTRUCCION DE PRETILES DE CONCRETO Y TABIQUE ROJO RECOCIDO EN LOSA DE AZOTEA (N 7.8 M); DESPLANTEDE MUROS DOBLES EN LOSA DE AZOTEA (N 9.8 M); CONSTRUCCION DE PRETILES DE CONCRETO SOBRE MUROS; APLICACIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES; INICIO DE LA COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 60X60 EN PISOS	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES

EDIFICIO UD-5 ETAPA 2

05 15 2020

05 15 2020

06 02 2020

06 02 2020

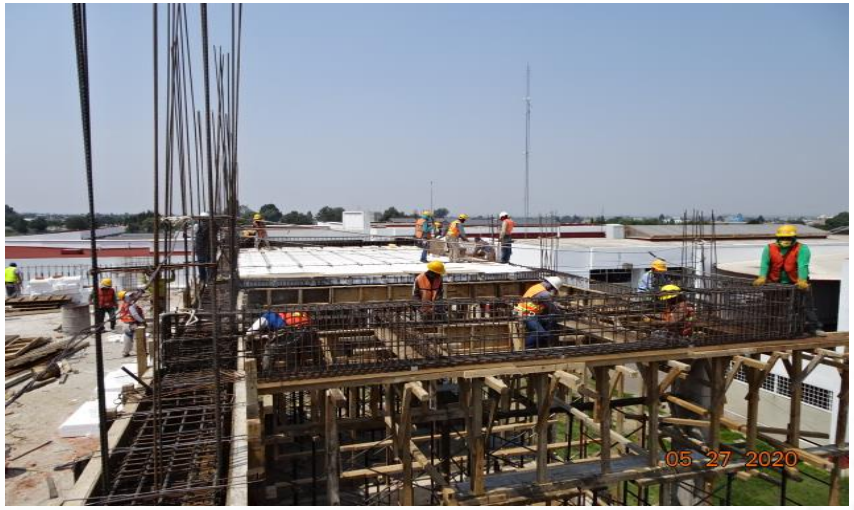
05 27 2020

05 15 2020

06 02 2020

06 04 2020

06 04 2020

06 04 2020

06 04 2020

06 04 2020

06 05 2020

06 09 2020

06 15 2020

06 15 2020
